



IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO 24.092,64 kW/p

COMUNE DI BONDENO (FE)

CRONOPROGRAMMA

28/02/2025	00	Emissione Finale	SGS srl	Giuseppe D'Amico /Luca Marabeti	Federico Boni Castagnetti
Data	Rev.	Descrizione Emissione	Preparato	Verificato	Approvato
Logo Committente e Denominazione Commerciale 			ID Documento Committente H_054_FV_00037_BGL		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale 			ID Documento Appaltatore H_054_FV_00037_BGL		

File name: H_054_FV_00037_BGL_CRONOPROGRAMMA

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
IMPIANTO AGRIVOLTAICO				
ALLESTIMENTO CANTIERE				
Fase 1 - Preparazione delle aree di cantiere				
Scavo di sbancamento	3	E	30	40
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	E	30	40
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere	3	E	3	3
Realizzazione di riempimento	3	E	3	5
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	E	5	7
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	E	3	3
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2	E	4	6
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2	E	3	5
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	2	E	3	5
LAVORAZIONI				
Fase 2 - Impianto zona 1				
Formazione di fondazione stradale	3	E	20	26
Formazione di rilevato stradale	3	E	15	24
Posa sostegni	4	E	20	29
Scavo a sezione obbligata	1	E	7	10
Posa tubazioni per linee elettriche	5	E	8	12
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili	5	E	4	6
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	5	E	5	7
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5	E	2	4
Montaggio di monoblocco prefabbricato in c.a.	5	E	3	3
Installazione moduli fotovoltaici	4	E	32	45
Posa di pali per lampioni e TVCC	7	E	5	5
Realizzazione di impianto elettrico - collegamenti	7	E	24	32
Realizzazione impianto di regolazione e controllo	4	E	9	11
Collaudi	7	E	6	8
Piantumazione arborea localizzata	6	E	10	12
Fase 3 - Impianto zona 2				
Formazione di fondazione stradale	3	E	40	59
Formazione di rilevato stradale	3	E	29	40
Posa sostegni	4	E	40	54
Scavo a sezione obbligata	1	E	15	22
Posa tubazioni per linee elettriche	5	E	16	22
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili	5	E	5	7
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	5	E	4	6
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5	E	2	2
Montaggio di monoblocco prefabbricato in c.a.	5	E	6	8
Installazione moduli fotovoltaici	4	E	64	89

Tabella Analitica Gantt

Posa di pali per lampioni e TVCC	7	E	15	19
Realizzazione di impianto elettrico - collegamenti	7	E	48	66
Realizzazione impianto di regolazione e controllo	4	E	20	29
Collaudi	7	E	10	18
Piantumazione arborea localizzata	6	E	20	32
Fase 4 - Impianto zona 3				
Formazione di fondazione stradale	3	E	30	42
Formazione di rilevato stradale	3	E	22	30
Posa sostegni	4	E	30	43
Scavo a sezione obbligata	1	E	15	19
Posa tubazioni per linee elettriche	5	E	12	16
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili	5	E	5	7
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	5	E	4	6
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5	E	2	2
Montaggio di monoblocco prefabbricato in c.a.	5	E	3	3
Installazione moduli fotovoltaici	4	E	48	66
Posa di pali per lampioni e TVCC	7	E	8	10
Realizzazione di impianto elettrico - collegamenti	7	E	44	61
Realizzazione impianto di regolazione e controllo	4	E	16	26
Collaudi	7	E	10	12
Piantumazione arborea localizzata	6	E	15	19
Fase 5 - Linea elettrica MT				
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	25	33
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	42	59
Montaggio di parapetti provvisori	1	E	42	59
Scavo a sezione obbligata	1	E	38	53
Posa di cavo di MT	7	E	38	55
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	39	54
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	9	11
Fase 6 - Realizzazione Cabina Trafo				
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili	1	E	5	5
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	4	4
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	2	4
Montaggio di monoblocco prefabbricato in c.a.	1	E	3	3
Installazione Trafo	7	E	5	5
SMOBILIZZO DEL CANTIERE				
Fase 7 - Smobilizzo del cantiere				
Pulizia generale dell'area di cantiere	2	E	9	11
Smobilizzo del cantiere	2	E	6	8
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili	1	E	5	5
LEGENDA:				
Z = ZONA				

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = Movimenti terra
- 2) = Area di cantiere logistica
- 3) = Preparazione area
- 4) = Impianto FV
- 5) = Opere edili
- 6) = Opere giardiniere
- 7) = Impianto elettrico


I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:


- 1) = Impresa appaltatrice (Capogruppo Mandataria)
 - 2) = Impresa esecutrice subappaltatrice
 - 3) = Impresa esecutrice subappaltatrice
 - 4) = Impresa esecutrice subappaltatrice
- E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

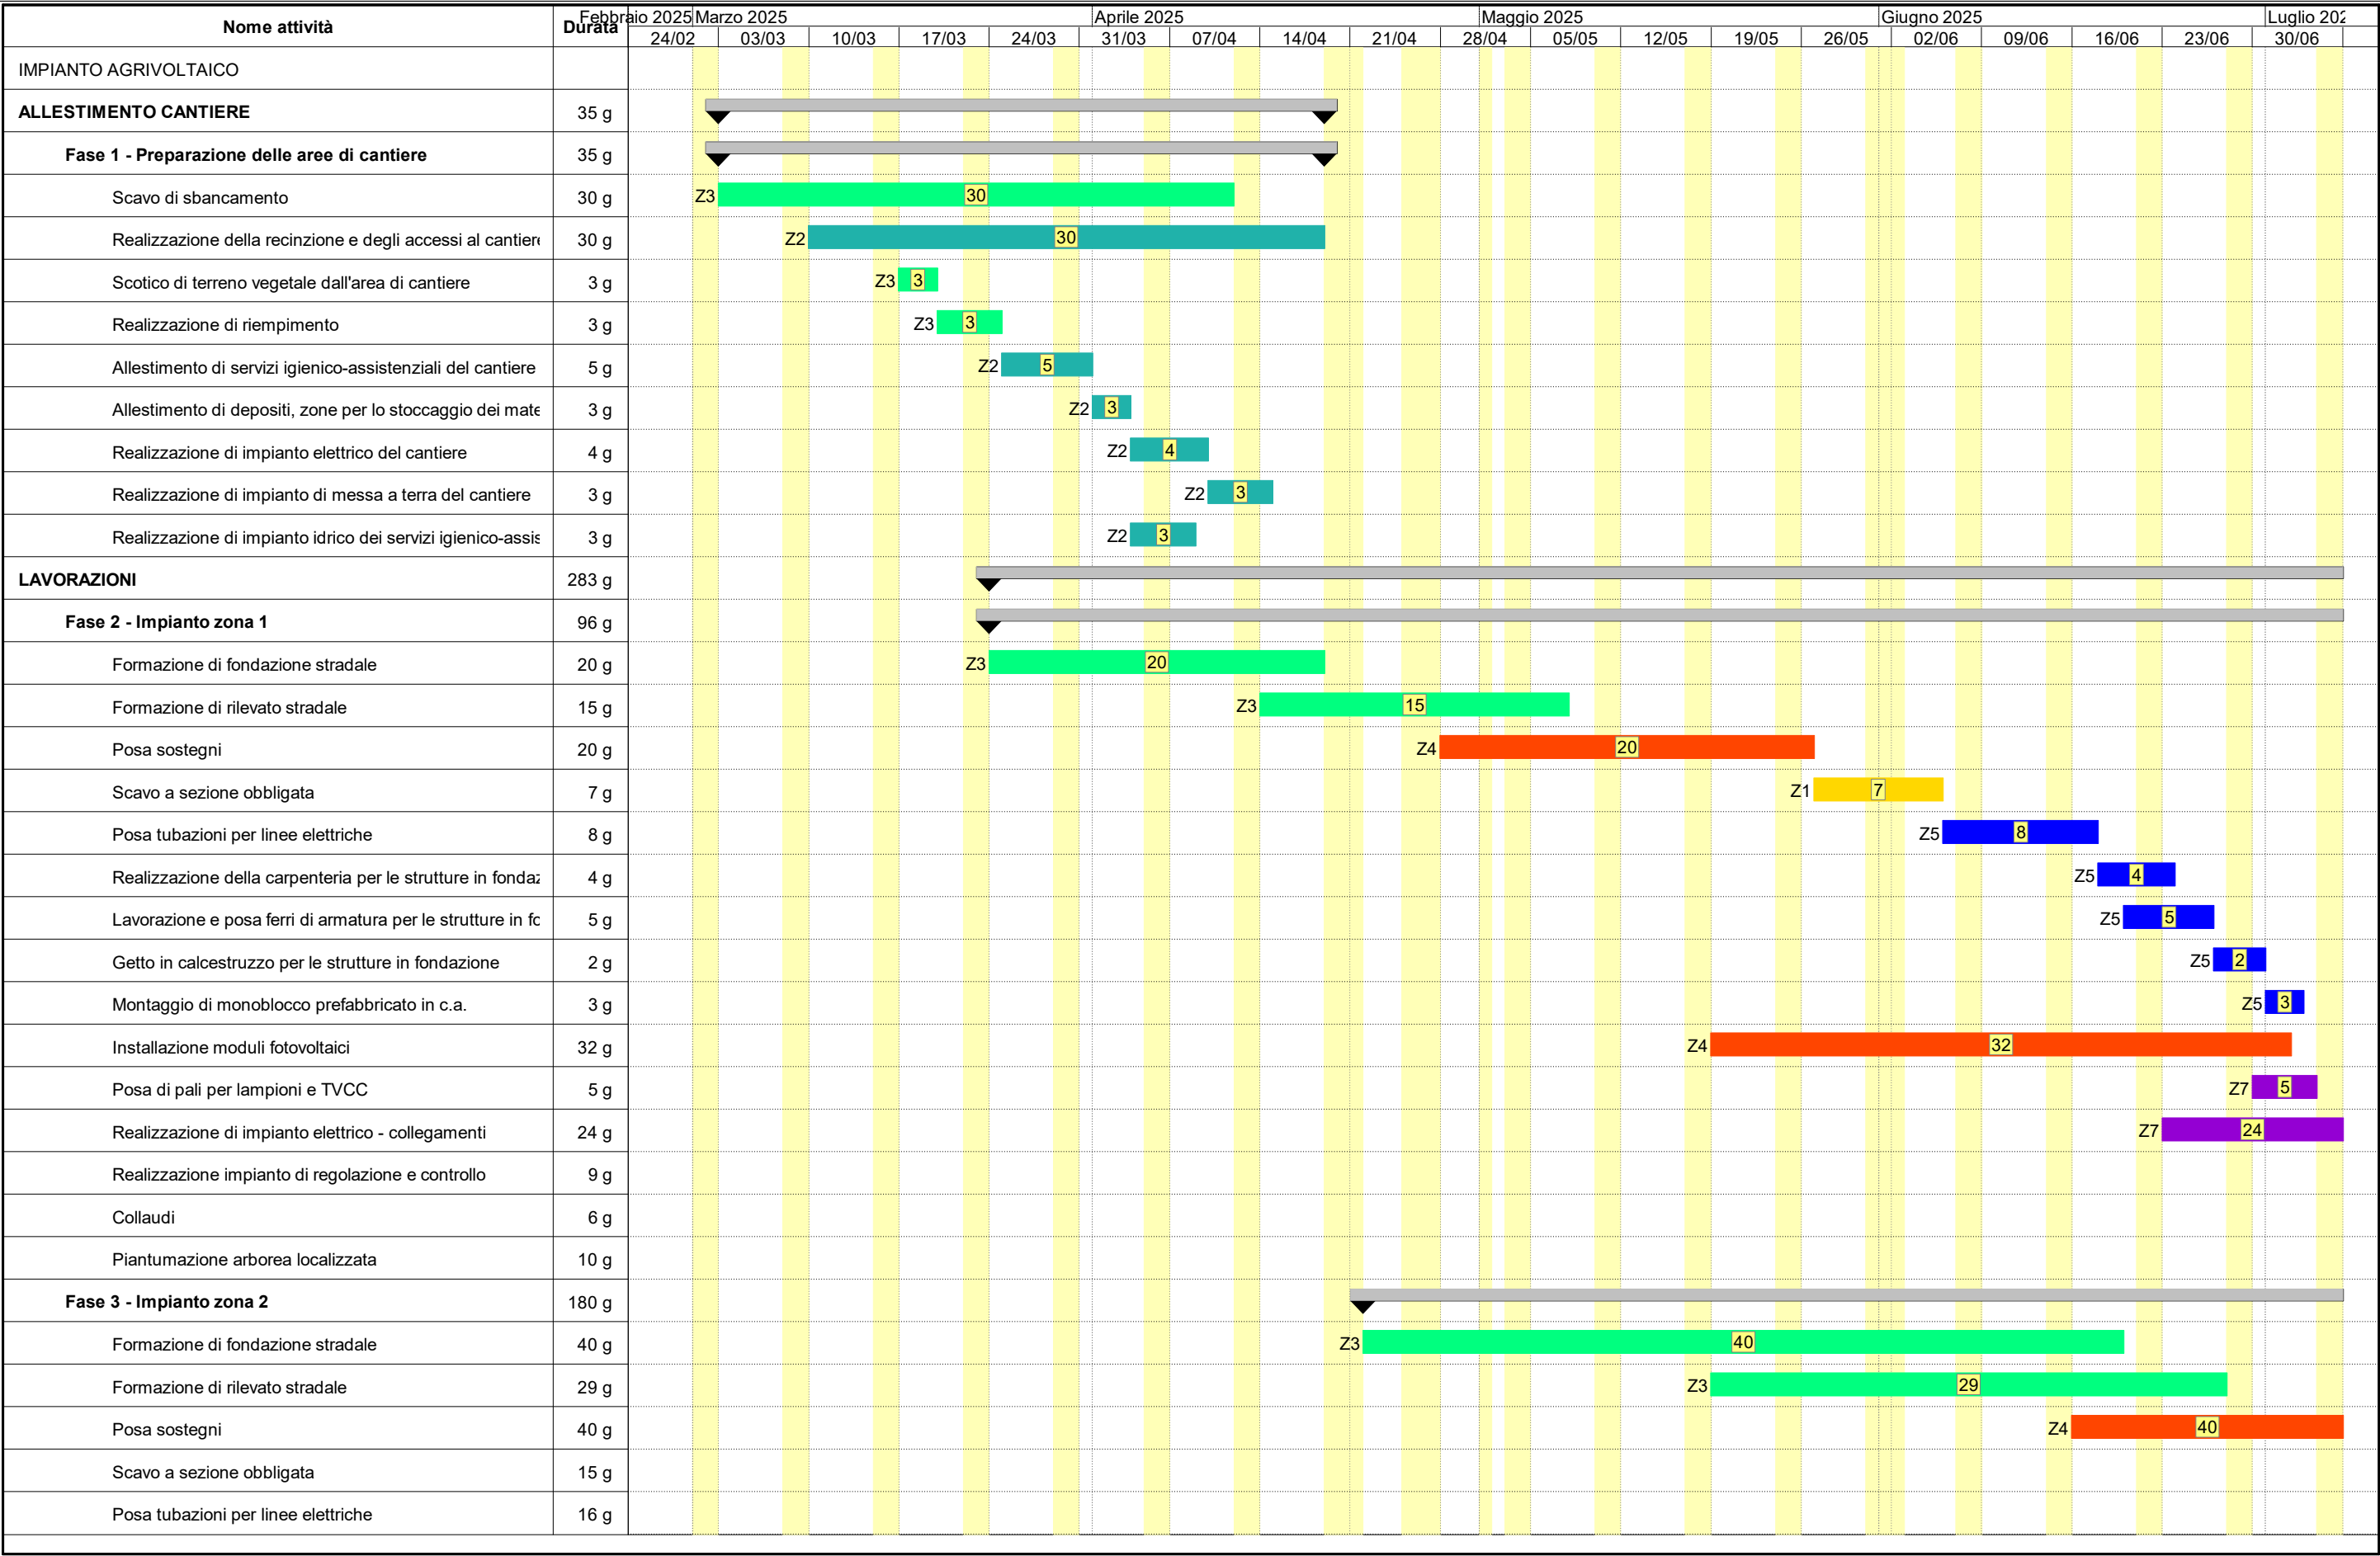


Nome attività	Durata	Febbraio 2025	Marzo 2025			Aprile 2025					Maggio 2025				Giugno 2025					Luglio 2025	
		24/02	03/03	10/03	17/03	24/03	31/03	07/04	14/04	21/04	28/04	05/05	12/05	19/05	26/05	02/06	09/06	16/06	23/06	30/06	
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz	5 g																				
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fc	4 g																				
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2 g																				
Montaggio di monoblocco prefabbricato in c.a.	6 g																				
Installazione moduli fotovoltaici	64 g																				
Posa di pali per lampioni e TVCC	15 g																				
Realizzazione di impianto elettrico - collegamenti	48 g																				
Realizzazione impianto di regolazione e controllo	20 g																				
Collaudi	10 g																				
Piantumazione arborea localizzata	20 g																				
Fase 4 - Impianto zona 3	160 g																				
Formazione di fondazione stradale	30 g																				
Formazione di rilevato stradale	22 g																				
Posa sostegni	30 g																				
Scavo a sezione obbligata	15 g																				
Posa tubazioni per linee elettriche	12 g																				
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz	5 g																				
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fc	4 g																				
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2 g																				
Montaggio di monoblocco prefabbricato in c.a.	3 g																				
Installazione moduli fotovoltaici	48 g																				
Posa di pali per lampioni e TVCC	8 g																				
Realizzazione di impianto elettrico - collegamenti	44 g																				
Realizzazione impianto di regolazione e controllo	16 g																				
Collaudi	10 g																				
Piantumazione arborea localizzata	15 g																				
Fase 5 - Linea elettrica MT	58 g																				
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	25 g																				
Asportazione di strato di usura e collegamento	42 g																				
Montaggio di parapetti provvisori	42 g																				
Scavo a sezione obbligata	38 g																				
Posa di cavo di MT	38 g																				
Rinterro di scavo eseguito a macchina	39 g																				
Formazione di manto di usura e collegamento	9 g																				
Fase 6 - Realizzazione Cabina Trafo	19 g																				



Luglio 2025



Luglio 2025

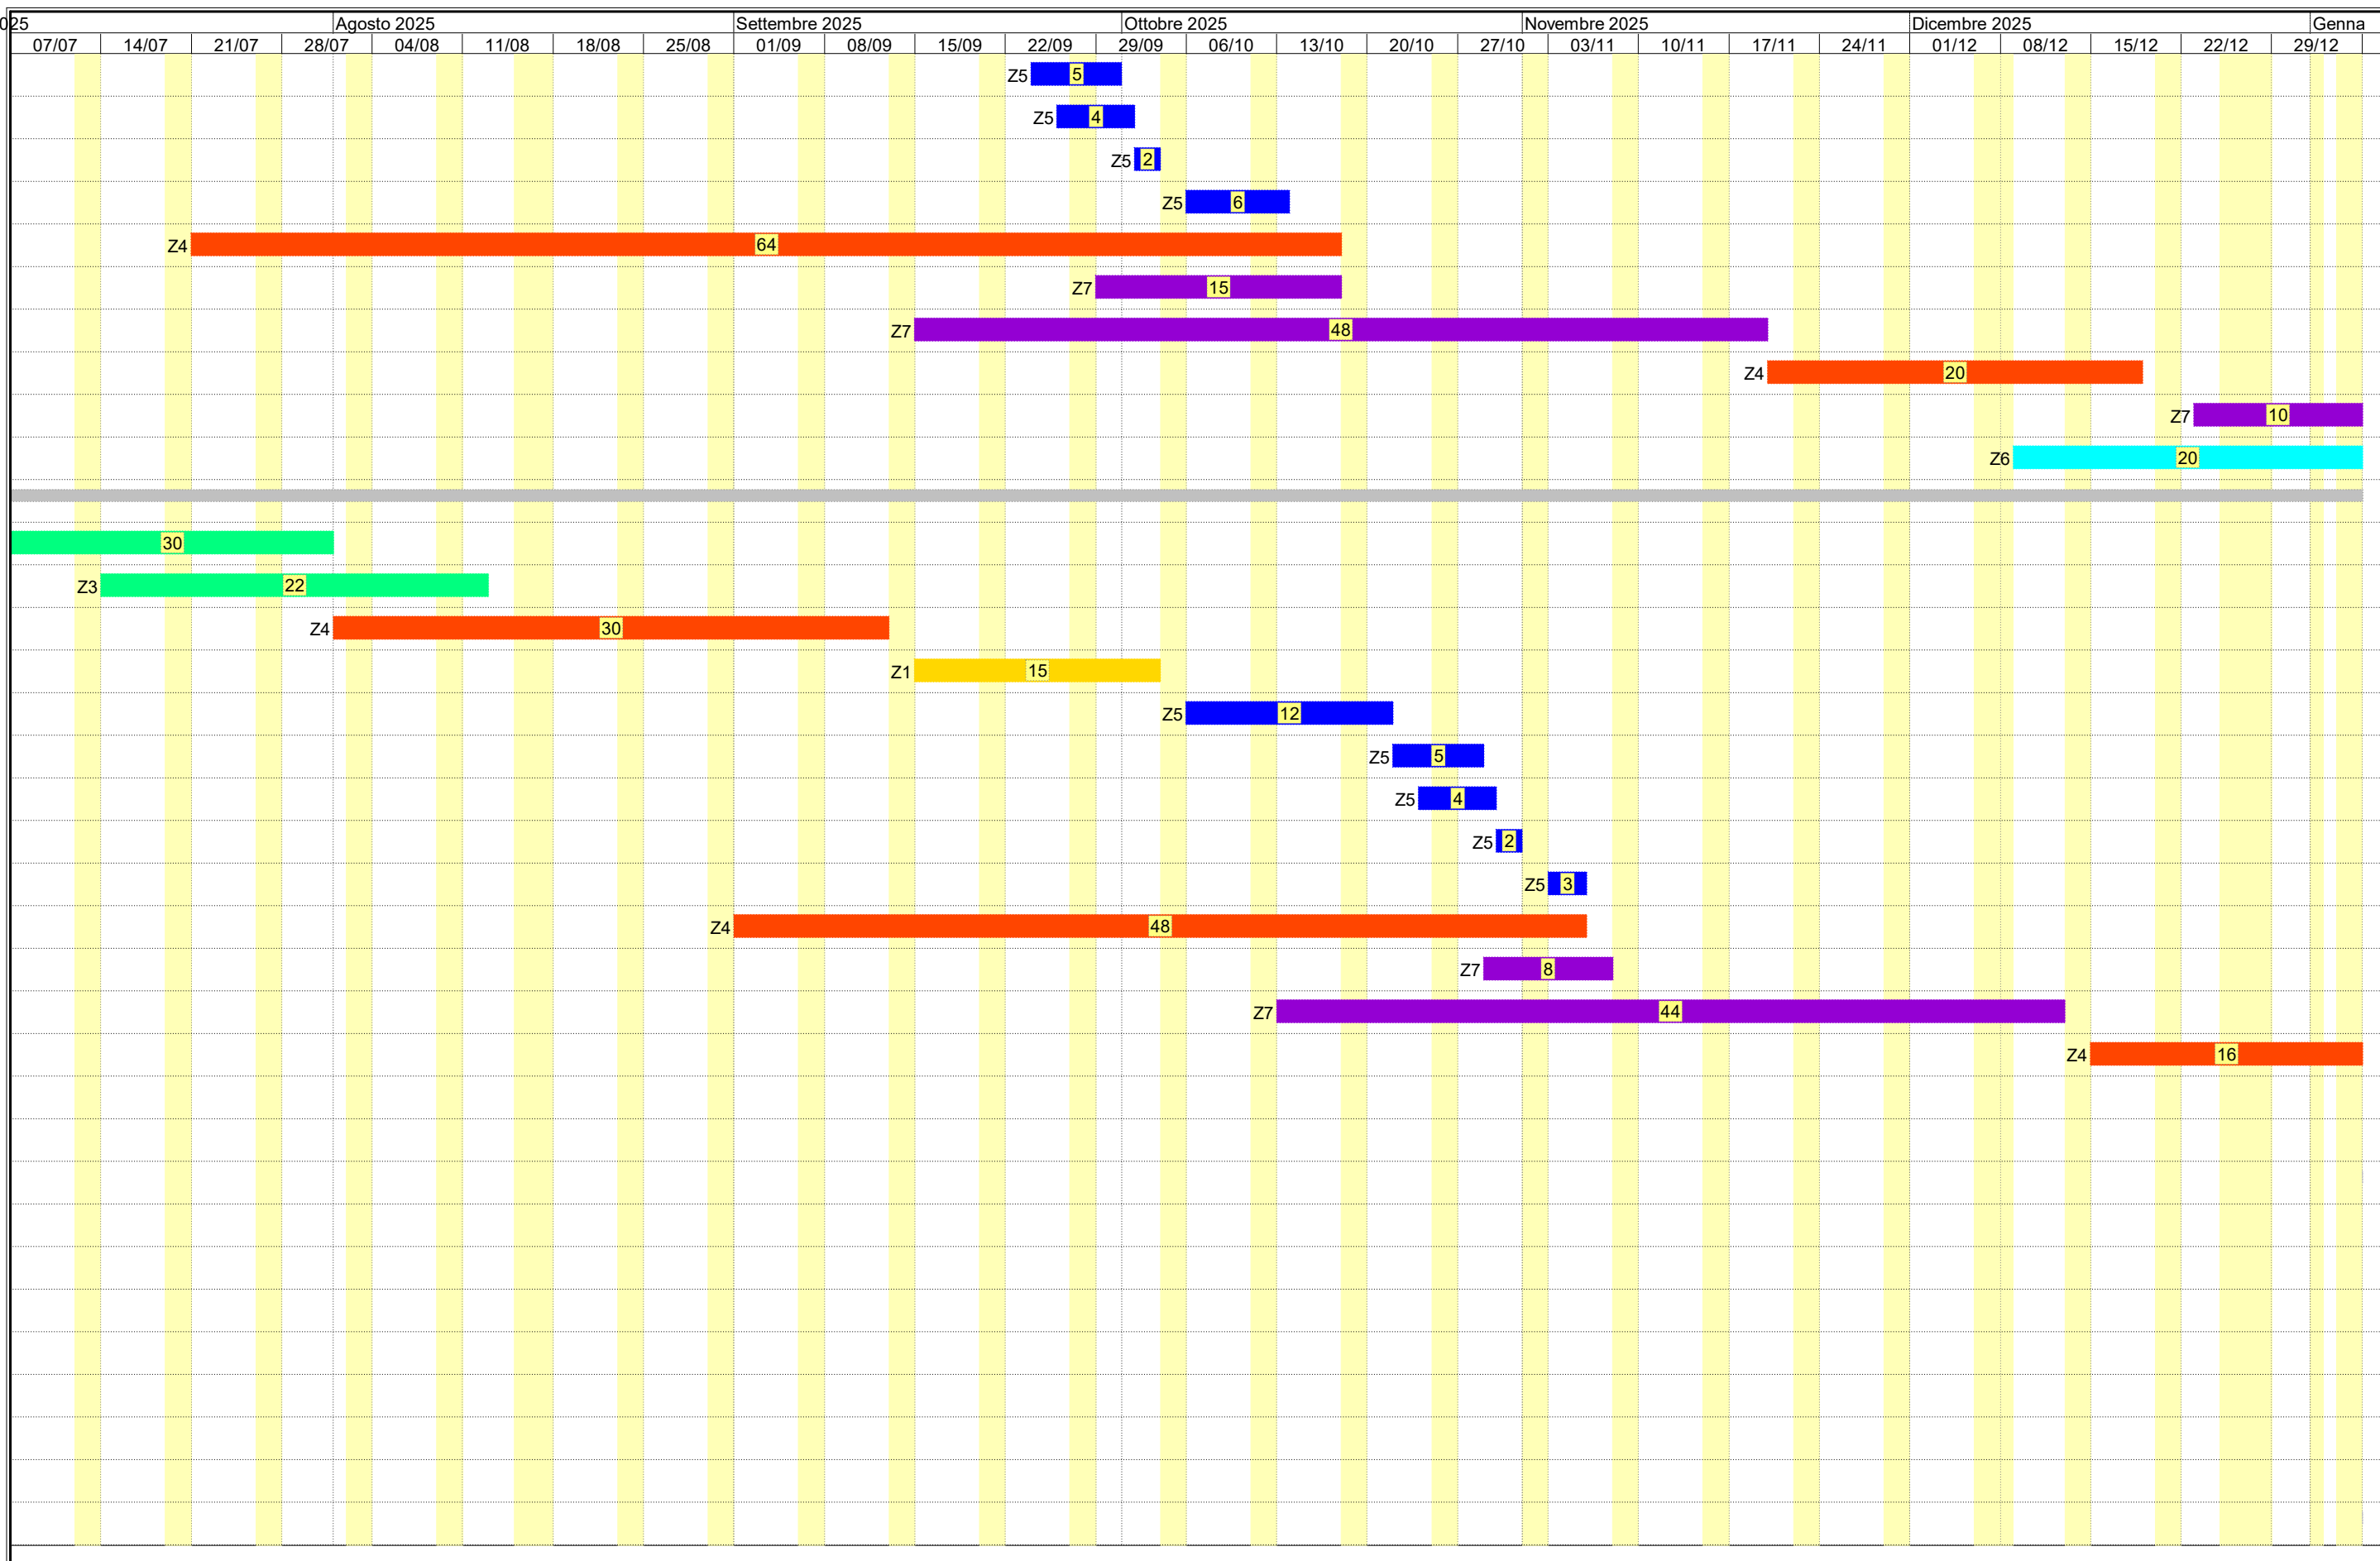

Luglio 2025

[illegible]

[illegible]

