


N. ord.	Attività	Durata gg.
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		555
1	Aggludicazione gara	0
2	Redazione progetto esecutivo	0
3	Validazione e approvazione	0
REALIZZAZIONE EDIFICI PREFABBRICATI, PAVIMENTAZIONI E FORNITURA MURI A SECCO		
4	Aggludicazione gara	180
5	Assolvimento obblighi di legge per denuncia opere	15
6	Fornitura strutture prefabbricate	60
7	Realizzazione opere di fondazione Nuova Tettoia	90
8	Montaggio strutture prefabbricate Nuova Tettoia	150
9	Realizzazione sottoservizi e pavimentazioni Nuova Tettoia	60
10	Fornitura e posa in opera di muri prefabbricati per delimitazione aree di stoccaggio	120
11	Fornitura dei pannelli prefabbricati da sostituire	30
12	Realizzazione opere di revamping capannone esistente - smontaggio pannellature esistenti e demolizione parti in opera interferenti	45
13	Realizzazione opere di revamping capannone esistente - rifacimento pavimentazione industriale dentro al bacino di compostaggio	30
14	Realizzazione opere di revamping capannone esistente - rimontaggio nuove pannellature di tamponamento e serramenti	30
15	Realizzazione opere di revamping capannone esistente - realizzazione delle connessioni tra le strutture e pannelli	45
16	Realizzazione opere di revamping capannone esistente - sostituzione elementi in vetroresina in copertura e sistemazione del manto di copertura	30
17	Installazione canalizzazioni, sostegni e impiantistica del sistema di aspirazione e trattamento delle arie	60
REALIZZAZIONE STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE		
18	Realizzazione opere di fondazione di tettoie metalliche (pneumatici e cisterne di raccolta acque di lavaggio)	20
19	Fornitura e posa in opera di tettoie metalliche (pneumatici e cisterne di raccolta acque di lavaggio)	120
20	Realizzazione impianti all'interno delle tettoie metalliche (pneumatici e cisterne di raccolta acque di lavaggio)	15
EDIFICI DI SERVIZIO E INFRASTRUTTURE		
21	Demolizione palazzina esistente e vasca antincendio esistente	30
22	Realizzazione nuova palazzina uffici/spogliatoi	90
23	Realizzazione nuova rotatoria di accesso all'impianto	120
24	Realizzazione di vasca antincendio, gruppi di pompaggio, gruppo elettrogeno e cabine di comando "valvole a diluvio"	90
25	Realizzazione movimenti terra per formazione di rilevati (parcheggio e vasca antincendio)	30
26	Realizzazione sottoservizi e sistema di laminazione delle acque	60
27	Realizzazione pavimentazioni esterne	30
28	Realizzazione nuovo parcheggio e opere a verde	30
29	Realizzazione impianti esterni	60
30	Fornitura opere elettromeccaniche	120
31	Installazione opere elettromeccaniche	90





COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(PROVINCIA DI PARMA)

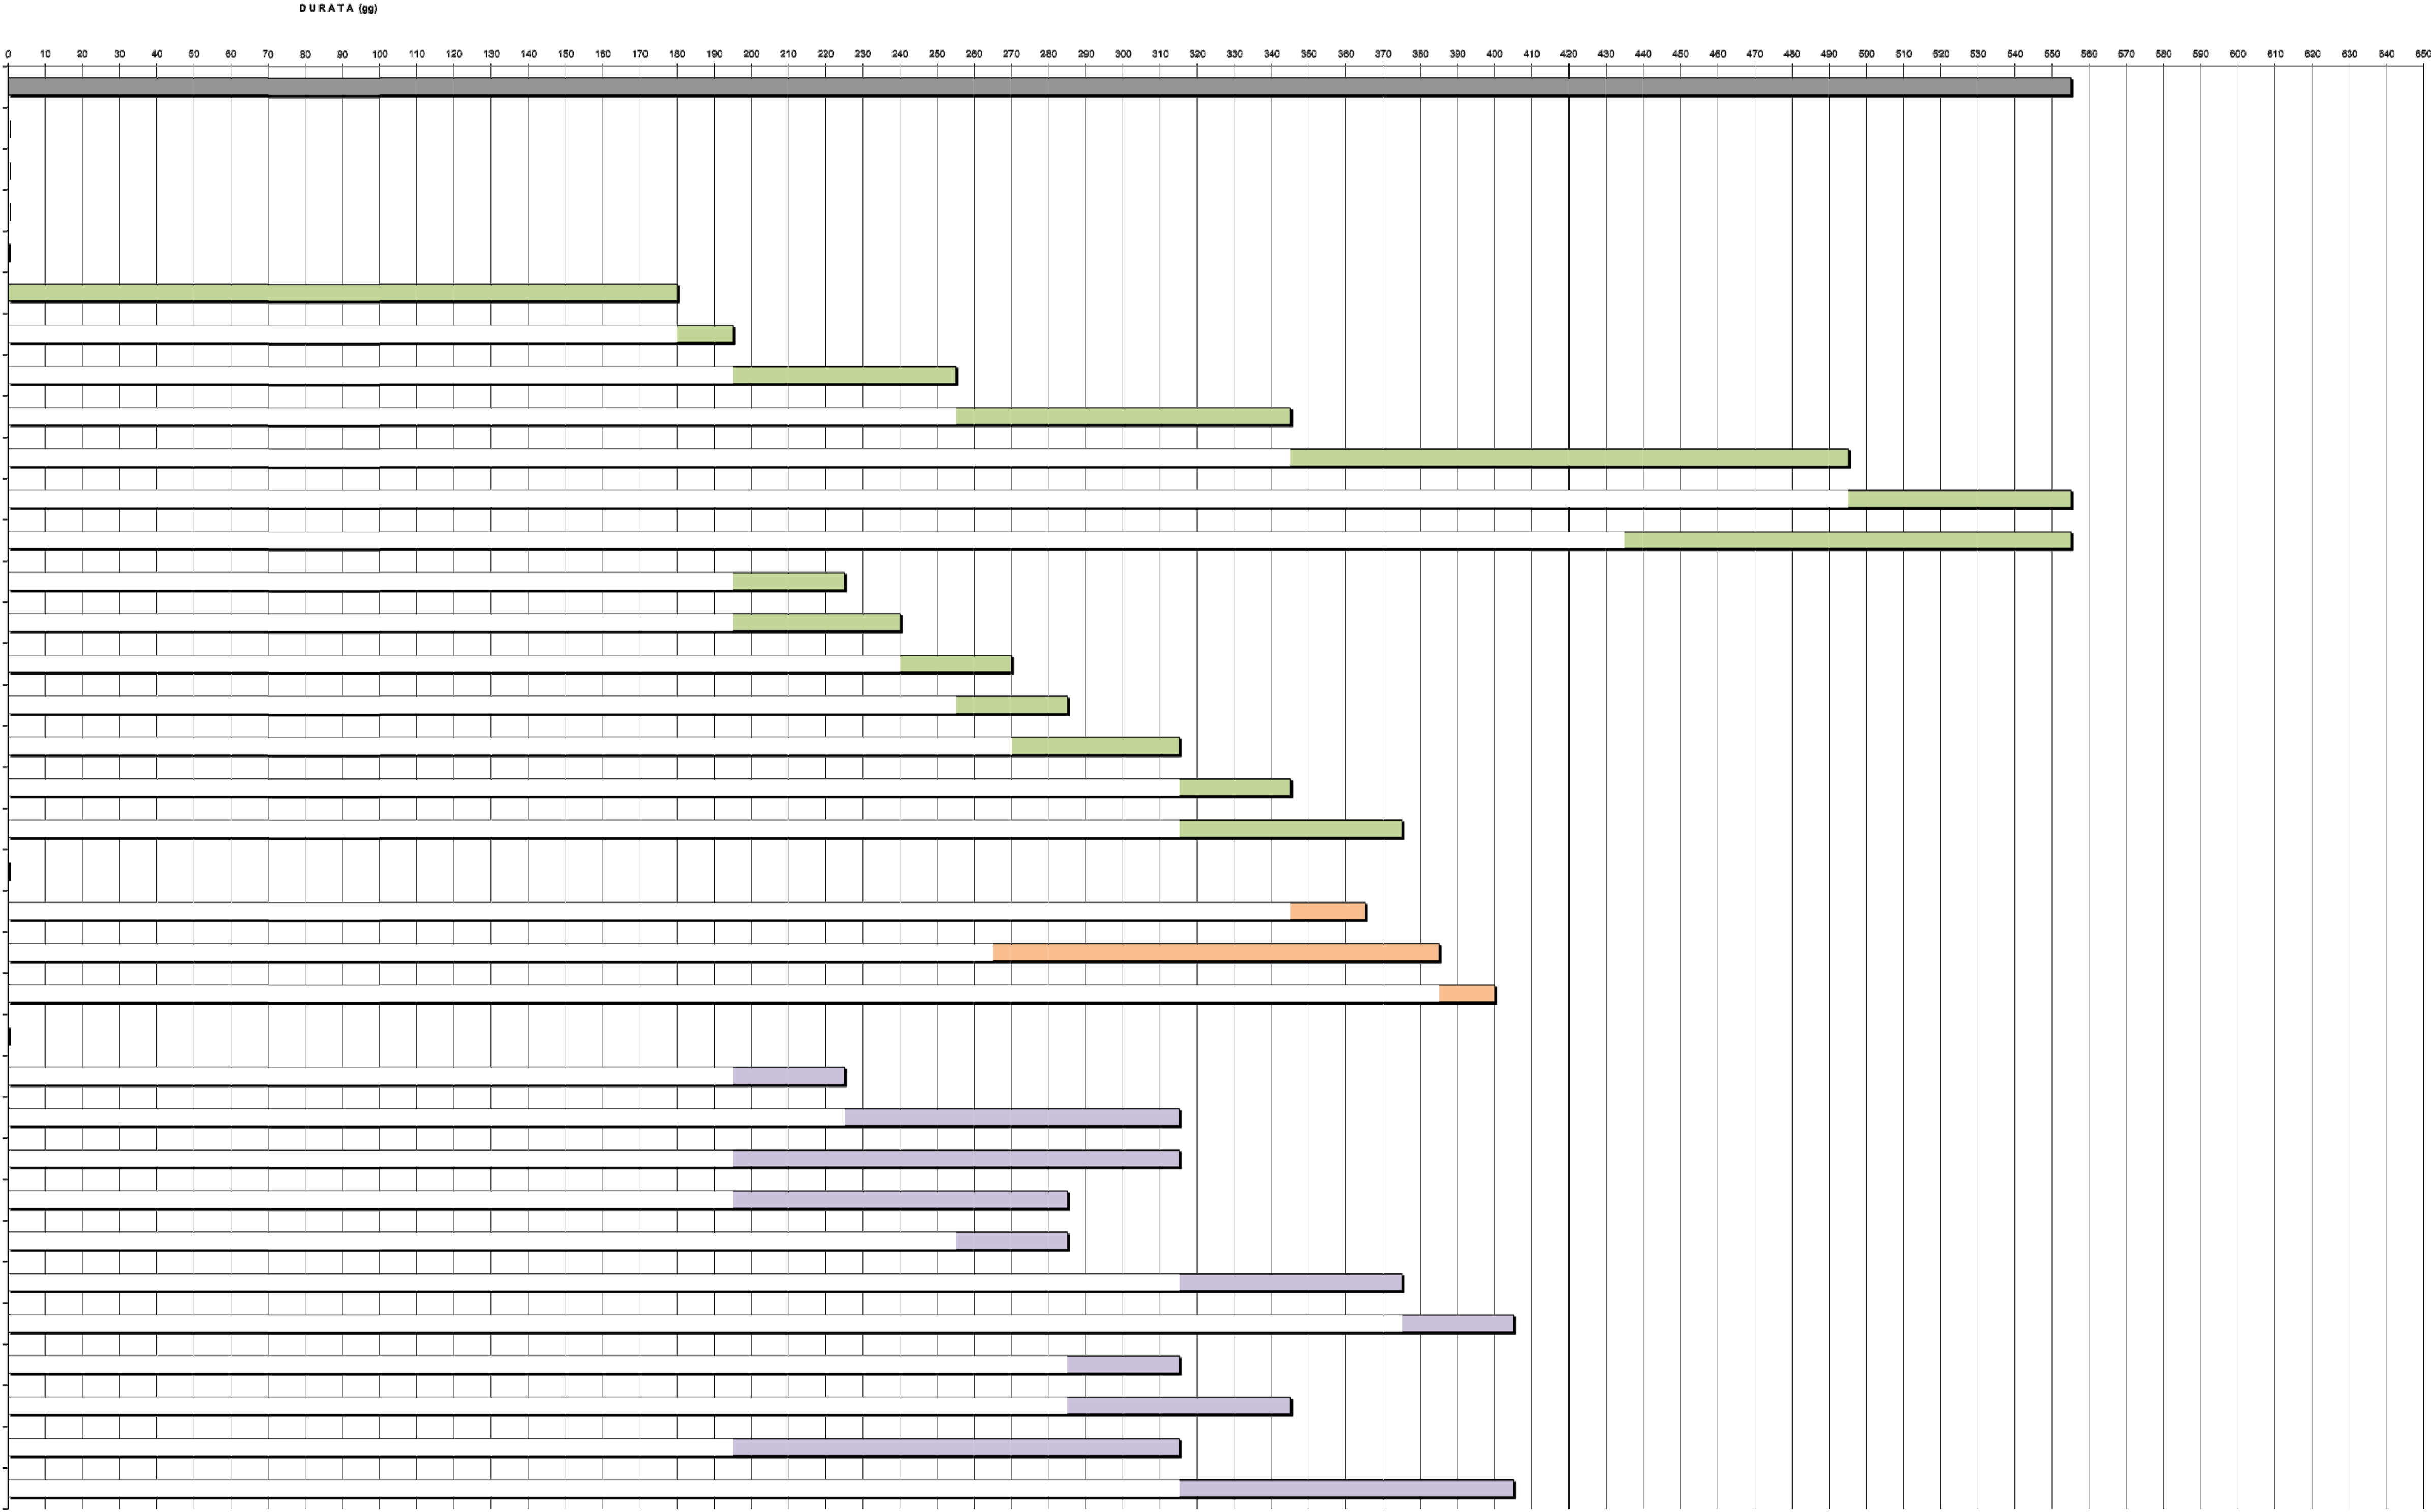

OPERA:
**IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
LOCALITÀ "MALCANTONE DI MEZZANI"**

**IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, IL PRETRATTAMENTO
E LA MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI**

OGGETTO:
PROGETTO DEFINITIVO

TAVOLA:
ECO 02

TITOLO:
CRONOPROGRAMMA

SCALA:
-

03					
02					
01					
00	Settembre 2021	Emissione	S. Teneggi	C. Ugolini	M. Pergetti
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Contr.	Appr.

IREN Ambiente S.p.A.
Sede Legale
Strada Borgoforte, 22
29122 Piacenza

Tel: 0523. 605026
Fax 0523. 505128
e-mail: iren@gruppoiren.it
www.gruppoiren.it



Redatto

Studio ALFA S.p.A.
V.le Ramazzini 39D
42124 Reggio Emilia

Direttore tecnico


Tutti i diritti sono riservati a norma di legge, di questo elaborato è vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza esplicita autorizzazione
