


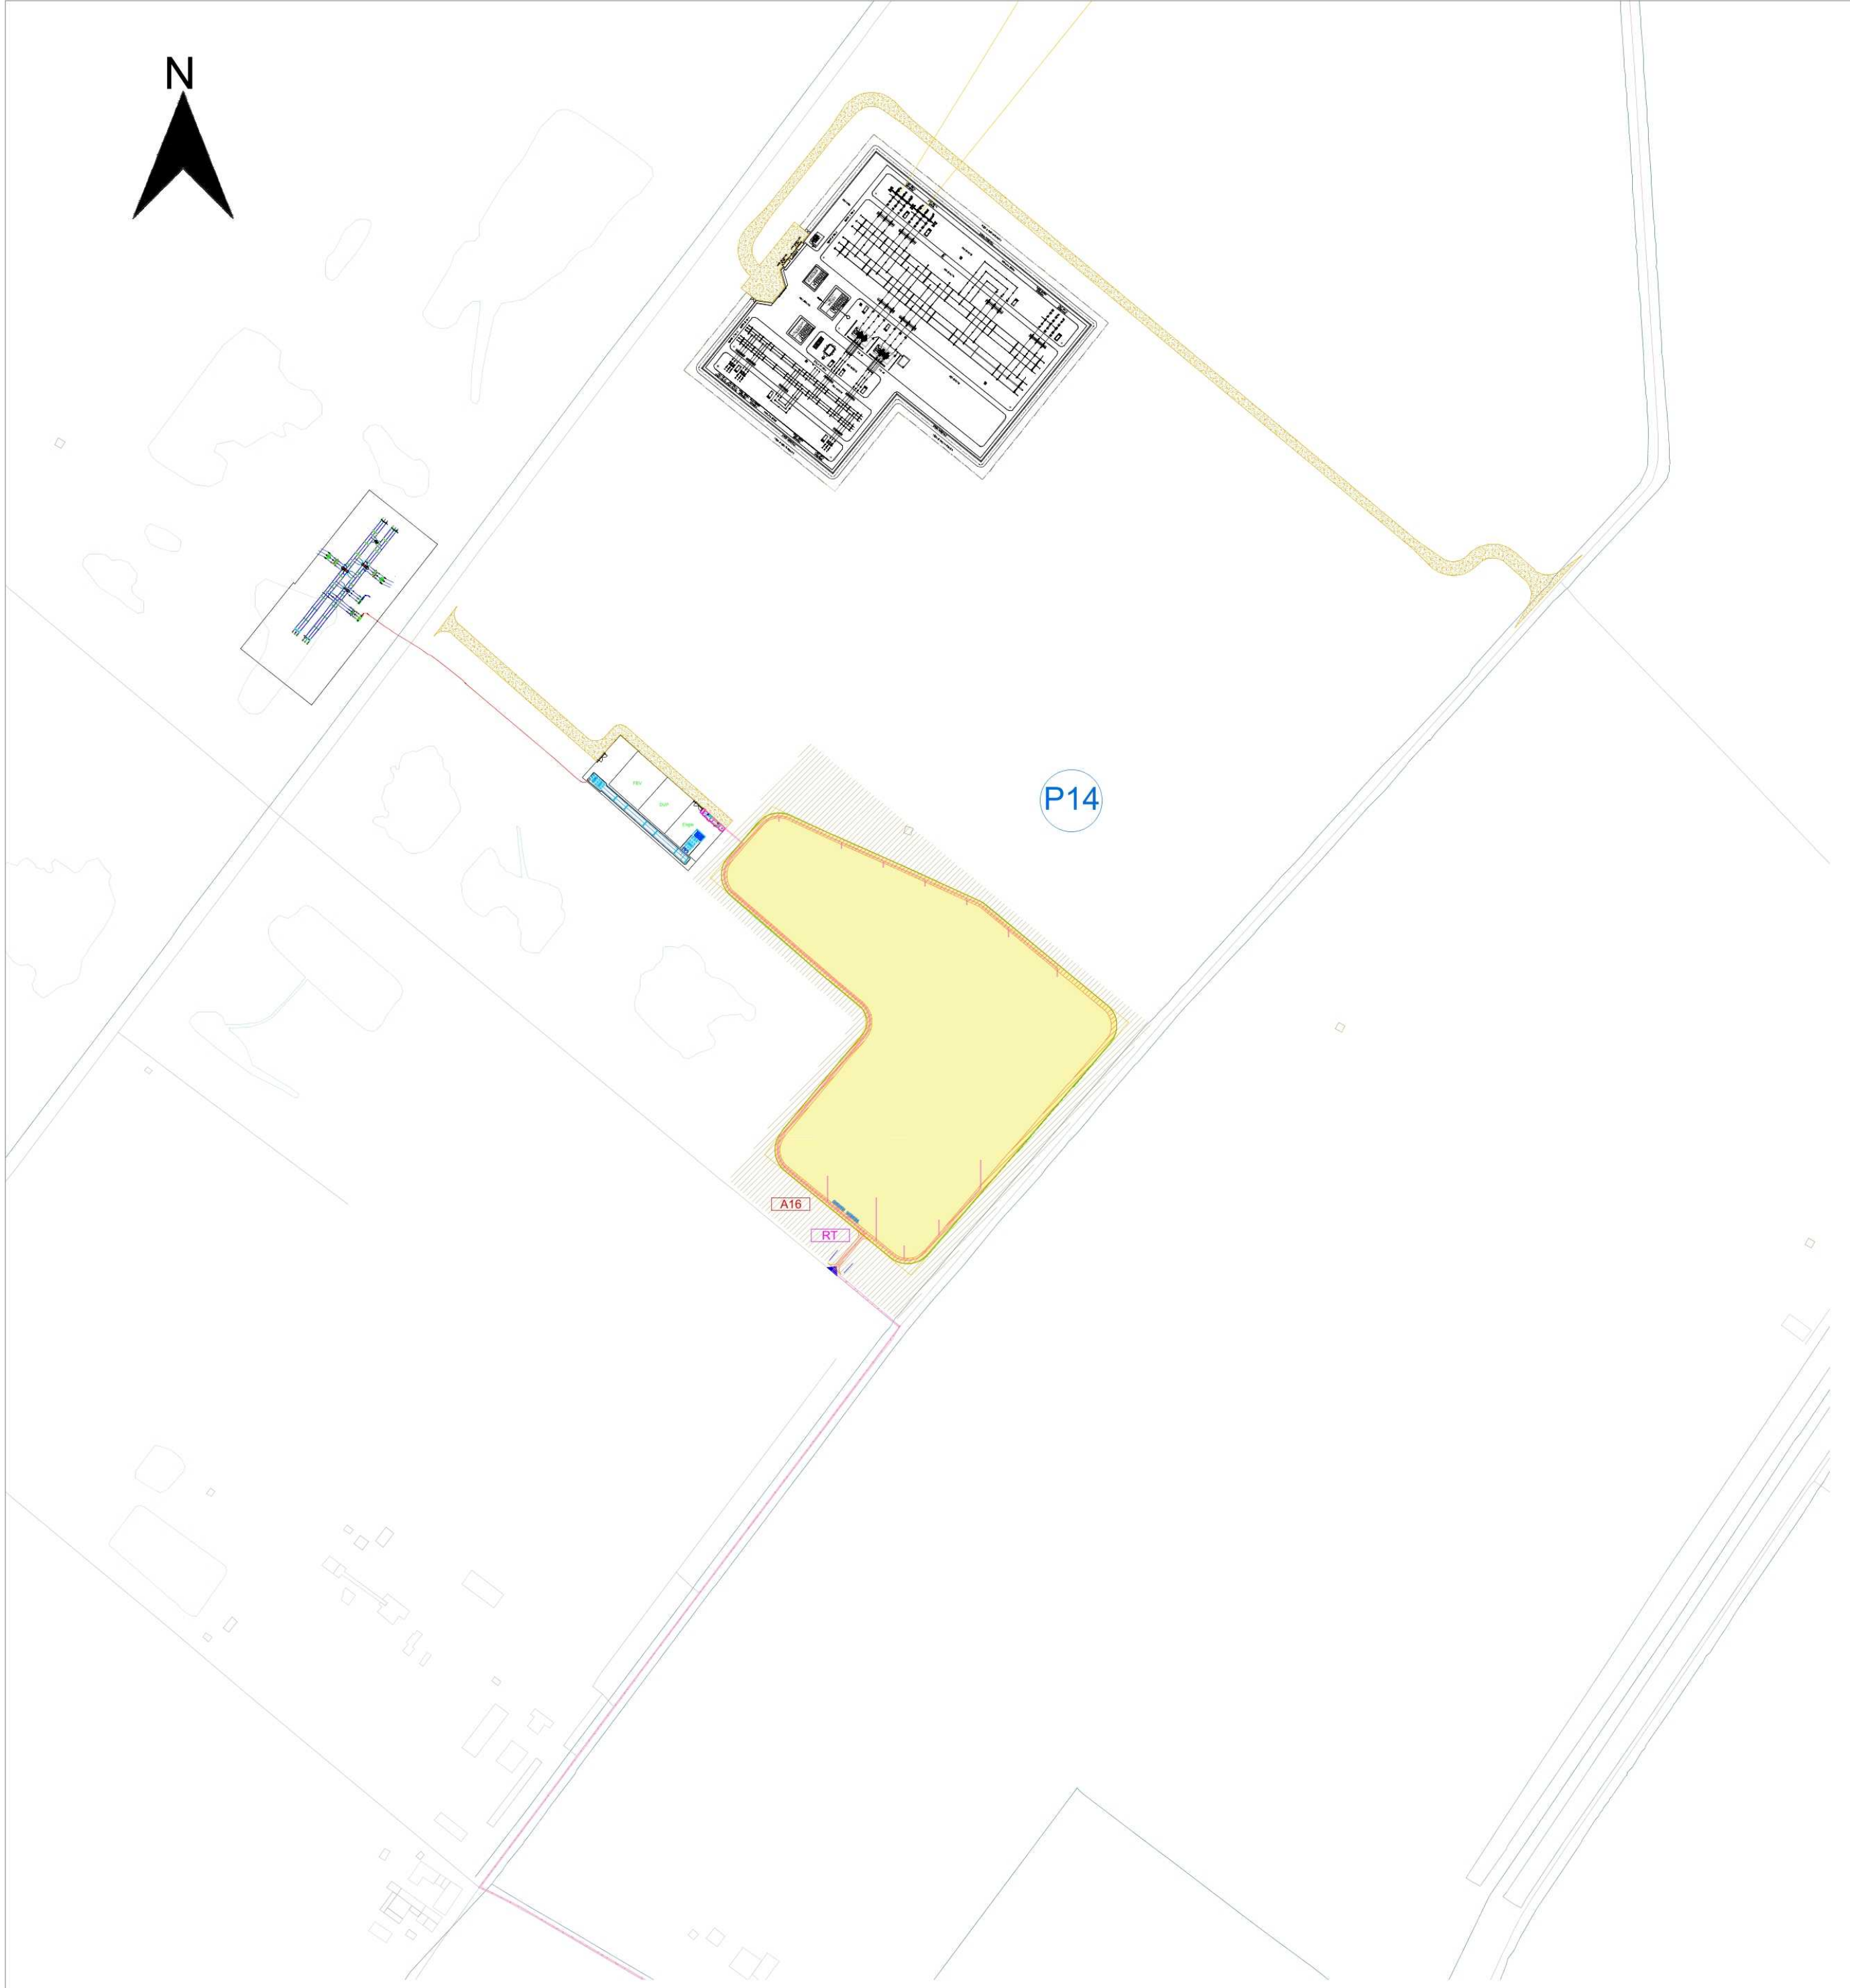

	Fasce di scavo per viabilità		Localizzazione impianto
	Fasce di scavo per cavidotti		Cono visivo
	Fasce di scavo per fondazioni cabine		
	Zona di scavo per videosorveglianza		
	Area destinata al rinterro		
	Area destinata al deposito e stoccaggio delle terre di scavo		

La realizzazione dell' impianto comporta movimentazione del terreno all' interno delle aree interessate dal progetto .

Le attività che comportano la produzione di terre di scavo sono:

- 1-Lo scortico superficiale (30 cm per 3,5 mt di larghezza) per realizzare le strade perimetrali in misto stabilizzato.
- 2- Il sistema di illuminazione e videosorveglianza perimetrale che comporta piccoli scavi per i plinti di fondazione dei pali e per i pozzetti di ispezione.
- 3-Gli elettrodotti in BT ed MT interni che, seguendo i profili tipici descritti nelle relazioni tecniche precedenti, comporranno materiali di scavo dei quali, tuttavia, circa l'80% sarà direttamente riutilizzato in situ per ricompare le fosse di scavo.
- 4-Il cavidotto MT esterno che comporrà anche esso dei materiali di scavo, di questo circa il 75% sarà direttamente riutilizzato in situ per ricompare la fossa di scavo.
- 5-La realizzazione delle 16 cabine di trasformazione BT/MT e 4 cabine di raccolta.

Ogni cabina MT/BT e ogni cabina di raccolta è dotata di una vasca di fondazione per la realizzazione della quale sarà necessario eseguire uno scavo.

Sulla fascia di mitigazione dell' impianto saranno ripartite esclusivamente le quantità non riutilizzate.

Nella tavola si evidenziano le zone adibite al deposito e allo stoccaggio delle terre di scavo movimentate prima di essere ripartite nella fascia di mitigazione, esse si posizionano Nelle piastre 5 e 12.

[illegible]
