SOCIETÀ PROPONENTE:
EPSILON TORO S.R.L.

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE "VIGARANO MAINARDA" DA INSTALLARE NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

RICCARDO CLEMENTI
16/10/2025 11:42:35 UTC+0200

00	09/2025	Prima emissione	MP	RM	RC
REV	**DATA**	**DESCRIZIONE**	**BY**	**CHK**	**APP**

"Il presente documento è di proprietà di Grid Shape s.r.l. – via Quattro Novembre, 2 – 35123 Padova (Italia). Tutti i diritti su questo documento, sulle immagini, sui disegni e sui testi sono riservati. È severamente vietato cedere, copiare, utilizzare e/o divulgare il presente documento e/o il suo contenuto a terzi. I trasgressori verranno perseguiti"
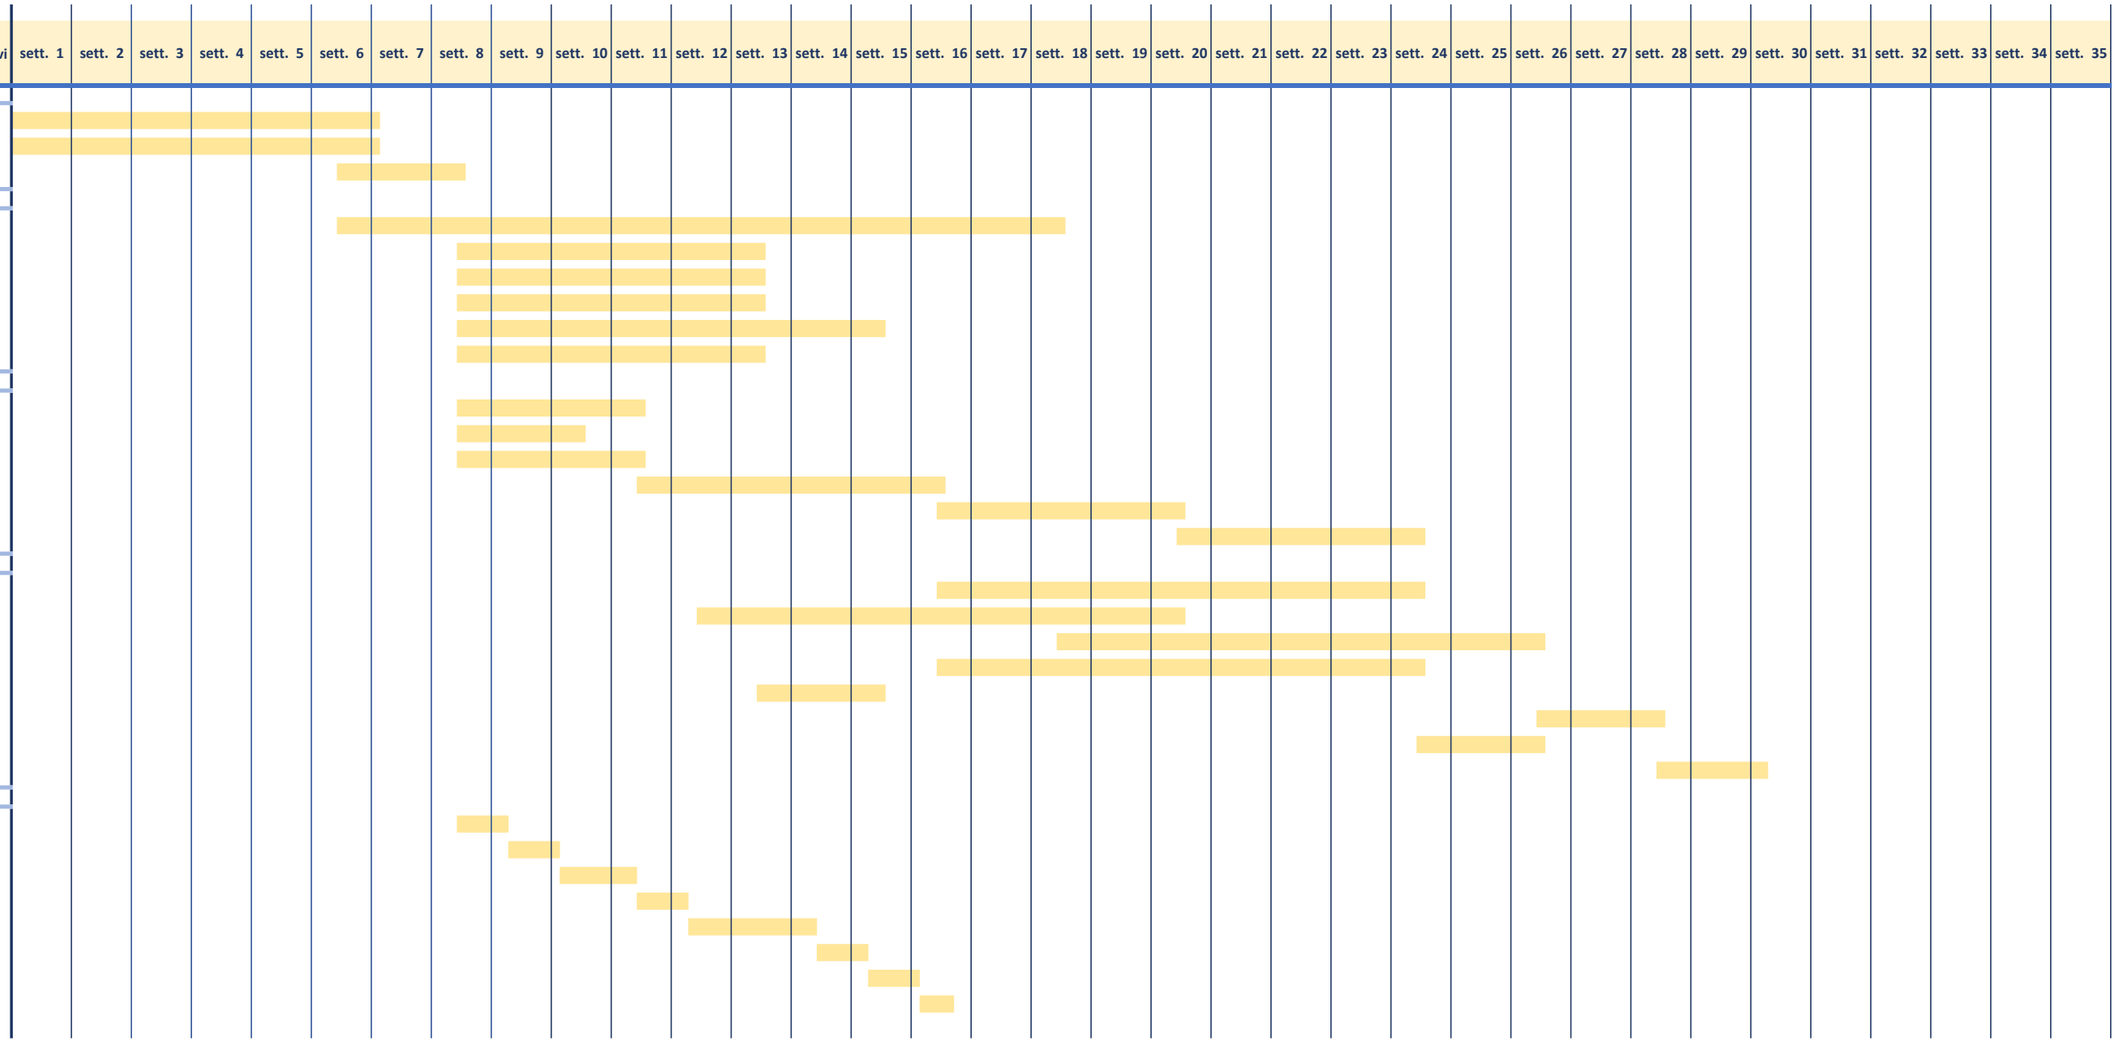
Attività	Giorni lavorativi
Ingegneria esecutiva	
Ingegneria civile dettagliata	30
Ingegneria elettrica dettagliata	30
Definizione computo metrico	10
Acquisti e trasporto in situ	
Pannelli	60
Tracker	25
Cabine	25
Inverter centralizzati	25
Cavi	35
Interruttori e quadri	25
Opere civili	
Preparazione cantiere	15
Site camp	10
Movimentazione terra	15
Trincee cavidotti	25
Recinzione e cancelli	20
Finiture	20
Installazione	
Battitura pali tracker	40
Installazione tracker	40
Installazione moduli FTV	40
Posa cavidotti	40
Equipaggiamento cabine	10
Installazione e connessione inverter	10
TVCC e illuminazione	10
Commissioning	8
Cavidotto 36kV (codifica tratte in allegato)	
TOC 1	3
TOC 2	3
TOC 3	6
TOC 4	3
TOC 5	10
TOC 6	3
TOC 7	3
TOC 8	3
