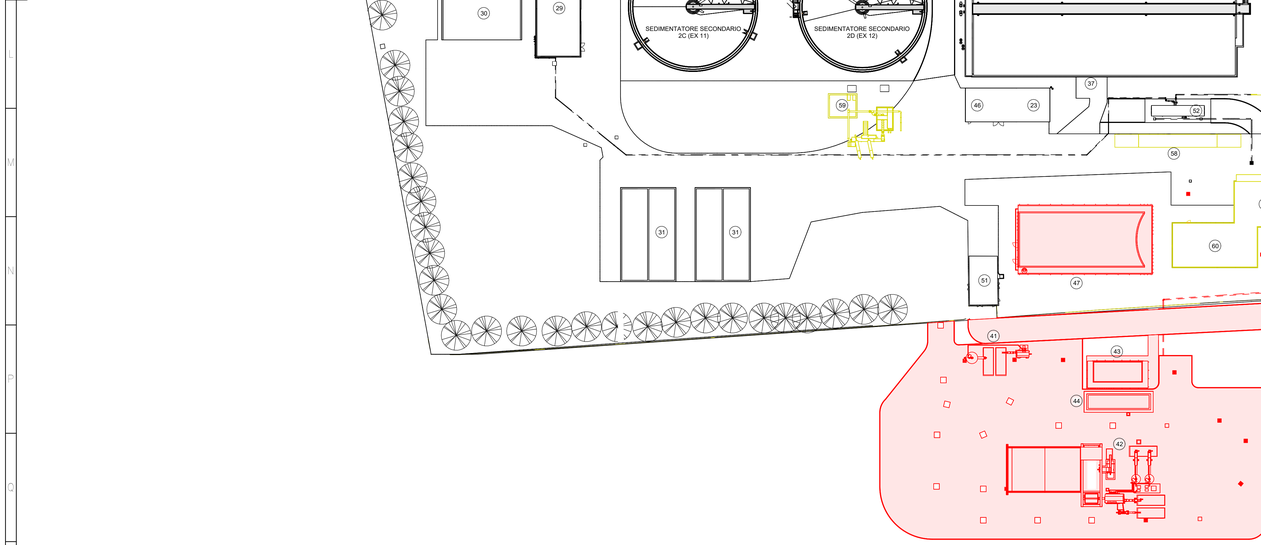

GRUPPO FASI 4

Scala 1 : 500

GRUPPO FASI	DURATA GRUPPO FASI (giorni)	NUMERO E DESCRIZIONE FASE	DURATA SINGOLA FASE (giorni)
4	180	Fase 5 - Revamping ripartitore alle linee biologiche 1 - 2 esistenti	170
		Fase 4 - Realizzazione nuova palazzina uffici (completamento)	317
		Fase 6 - Demolizione manufatti sedimentazione primaria e vasca accumulo fanghi	142
		Fase 24 - Allestimento locale ispessimento dinamico ed adeguamento centrale termica	156
		Fase 25 - Revamping pre-ispessimento statico	25
		Fase 26 - Revamping post-ispessimento statico	13
		Fase 30 - Realizzazione impianto trattamento rifiuti art. 110 comma 3 D.Lgs. 152/2006 (completamento)	387
		Fase 31 - Sistemazioni finali e dismissione cantiere impianto trattamento rifiuto art. 110 comma 3 D.Lgs. 152/2006	15
